

工事写真報告書

工事番号 平成 29 年度

工事名 M 様 邸

工事箇所 屋根・外壁・その他 塗装工事一式

工事住所 糟屋郡 宇美町 貴船

工 期 着 手 平成 29 年 2 月 25 日

竣 工 平成 29 年 4 月 16 日

工事施工者 ベストホーム株式会社



屋根 高圧洗浄中



屋根 高圧洗浄中




外壁 高圧洗浄中



外壁 高压洗净中



破風板 高压洗净中

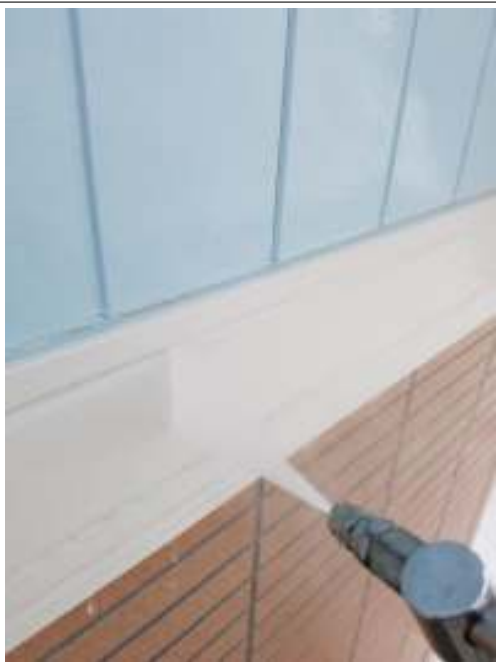

帯 高压洗净中



窓 高圧洗浄中




小庇 高圧洗浄中



シャッター 高圧洗浄中



屋根 施工前

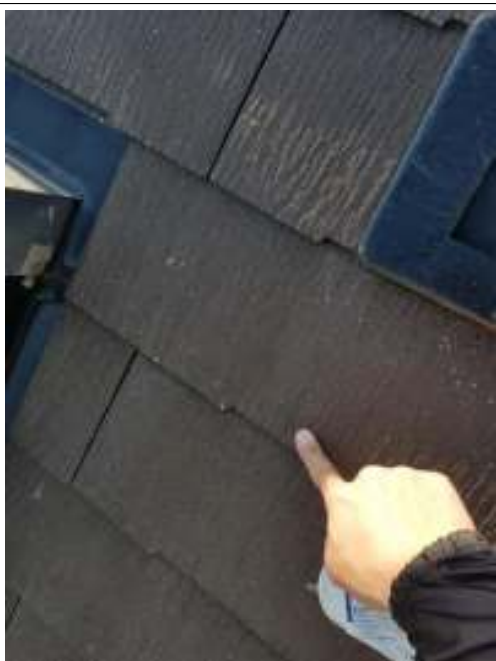

屋根 クラック補修施工前



屋根 クラック補修施工中



屋根 クラック補修施工後



屋根 クラック補修施工前



屋根 クラック補修施工中



屋根 クラック補修施工後



板金部 シーリング補修 施工中



板金部 シーリング補修 施工後



屋根板金 ケレン処理施工中



屋根板金 錆止め塗布施工中



屋根板金 錆止め塗布施工後



屋根 下塗り（1回目）施工中



屋根 下塗り（2回目）施工中



屋根 タスペーサー取付 施工中



屋根 中塗り施工中



屋根 上塗り施工中



屋根 施工完了



軒天 施工前




軒天 上塗り（1回目）施工中



軒天 上塗り（2回目）施工中



屋根 施工完了

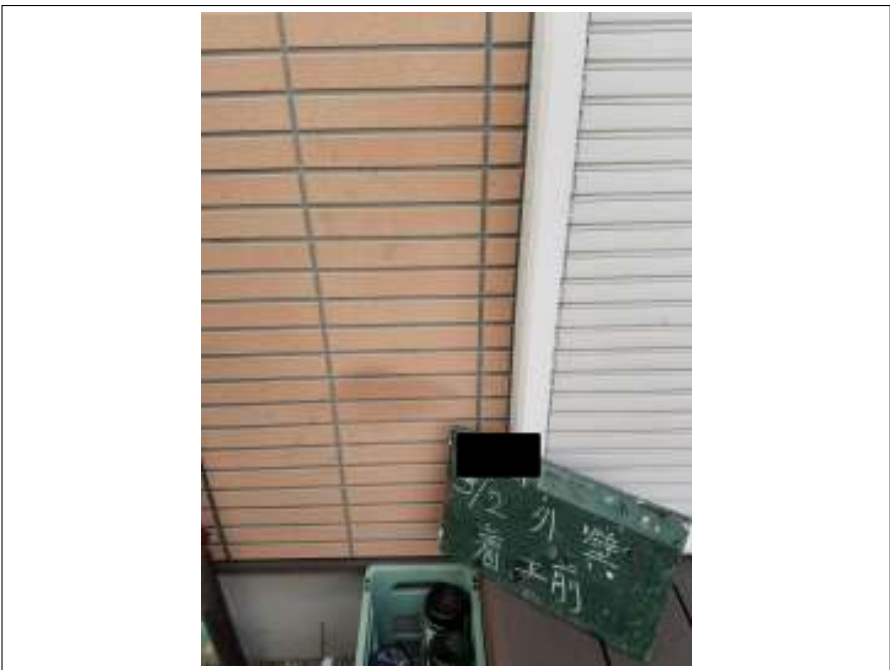

外壁 施工前



外壁 シーリング打ち替え施工後



外壁 欠損部補修 施工前



外壁 欠損部補修 施工中



外壁 欠損部補修 施工後



外壁 下塗り施工中



外壁 目地色（1回目）施工中



外壁 目地色（2回目）施工中



外壁 上塗り（1回目）施工中



外壁 上塗り（2回目）施工中



外壁 施工完了



外壁 施工前



外壁 下塗り施工中



外壁 中塗り施工中



外壁 上塗り施工中



外壁 施工完了





破風板 施工前



破風板 目粗し施工中



破風板 上塗り（1回目）施工中



破風板 上塗り（2回目）施工中



破風板 施工完了



鼻隠し 施工前



鼻隠し 目粗し施工中



鼻隠し 上塗り（2回目）施工中



鼻隠し 施工完了



樋 施工前



樋 目粗し施工中



樋 上塗り（2回目）施工中



樋 施工完了



樋 施工完了



樋 施工完了



帯 施工前



帯 上塗り（2回目）施工中



帯 施工完了



シャッター 施工前



シャッター 上塗り(2回目) 施工中



シャッター 施工完了



小庇 施工前



小庇 ケレン処理施工中



小庇 錆止め塗布施工後



小庇




小庇



小庇 施工完了



換気フード 施工前

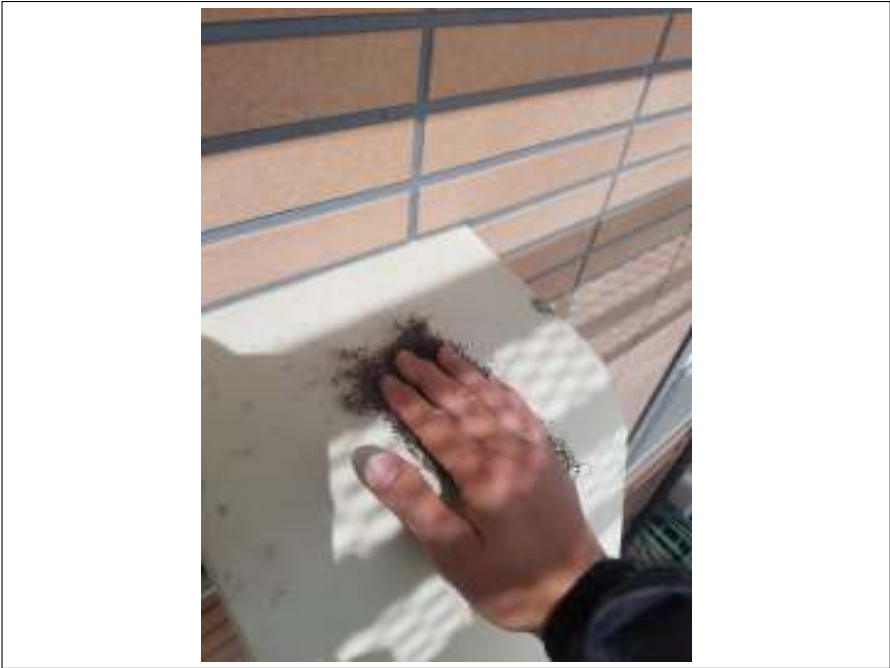

換気フード 目粗し施工中



換気フード



換気フード



換気フード 施工完了



笠木 施工完了



土台水切り 施工前



土台水切り 上塗り(1回目) 施工中



土台水切り 上塗り(1回目) 施工後



土台水切り 上塗り(2回目) 施工中



土台水切り 上塗り(2回目) 施工後





塀 施工前



塀 施工前



塀 施工前



塀 施工後



塀 施工後



塀 施工後



基礎 上塗り（1回目）施工中



基礎 上塗り（1回目）施工中



基礎 上塗り（2回目）施工中



基礎 施工完了



ベランダ 施工前



ベランダ 施工前



ベランダ 施工後



ベランダ 施工後



ベランダ 施工後



屋根 上塗り使用材料

超低汚染リファイン500Si-IR

色：パイオニア



屋根 下塗り使用材料

サーモテックシーラー



外壁 上塗り使用材料

超低汚染リファイン1000Si-IR

色：モカ



外壁 上塗り使用材料

超低汚染リファイン1000S i-IR

色：ニュートラルホワイト



外壁 中塗り使用材料

超低汚染リファイン1000S i-IR

色：アイアンバーグ



外壁 下塗り使用材料

プレミアムSSシーラープライマー



使用材料

セラマックス1500Si-JY

色：N-90



使用材料

セラマックス1500U-JY

色：19-30B



使用材料

マルチエースII-JY

色：N-90



使用材料

バリアー



使用材料

タスペーサー



使用材料

アステックプラスS



使用材料

ベースガード
